

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等の 進捗状況について

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業で整備する道路一体建物（南北通路・橋上駅舎・駅ビル）の早期開業をめざし、本事業の本体工事に先行し、準備工事である支障移転工事等を実施しているところである。

については、本支障移転工事等の進捗状況について報告する。

1 支障移転工事等の概要

(1) 工事期間

平成30年（2018年）10月～令和3年（2021年）3月

(2) 作業内容

昼間作業

① 工事用ヤード等整備工事（ヤード内支障物撤去、地盤改良）

夜間作業（概ね電車の運行終了時から開始時まで）

① 工事用ヤード等整備工事（線路内通路設置）

② 杭施工準備等工事

③～⑤ 駅施設支障移転工事（詰所等移設、ホーム改良、上家改良）

⑥ 電気設備支障移転工事

2 支障移転工事等の進捗状況

別紙1のとおり。

3 その他関連事項

中野駅北口と囲町方面を繋ぐ線路沿い通路（以下「線路沿い通路」という。）については、工事用ヤード拡大及び線路内諸作業に早期着手するための準備工事を行うため、夜間通行止めを実施する。その後、本年10月から工事用ヤードの拡大に伴い本通路を封鎖する。

夜間通行止め期間及び線路沿い通路封鎖後の歩行者動線については、別紙2のとおり。



4 今後の予定について

令和元年（2019年）

8月19日～9月30日 線路沿い通路夜間通行止め
午後11時から午前6時まで


10月1日以降 線路沿い通路封鎖

支障移転工事等 進捗状況

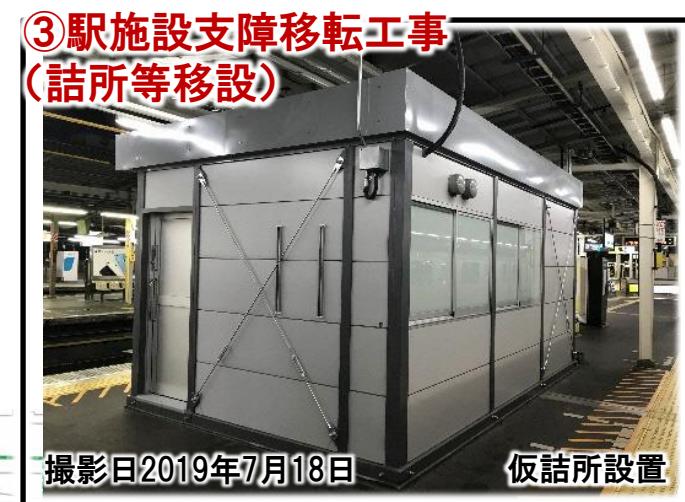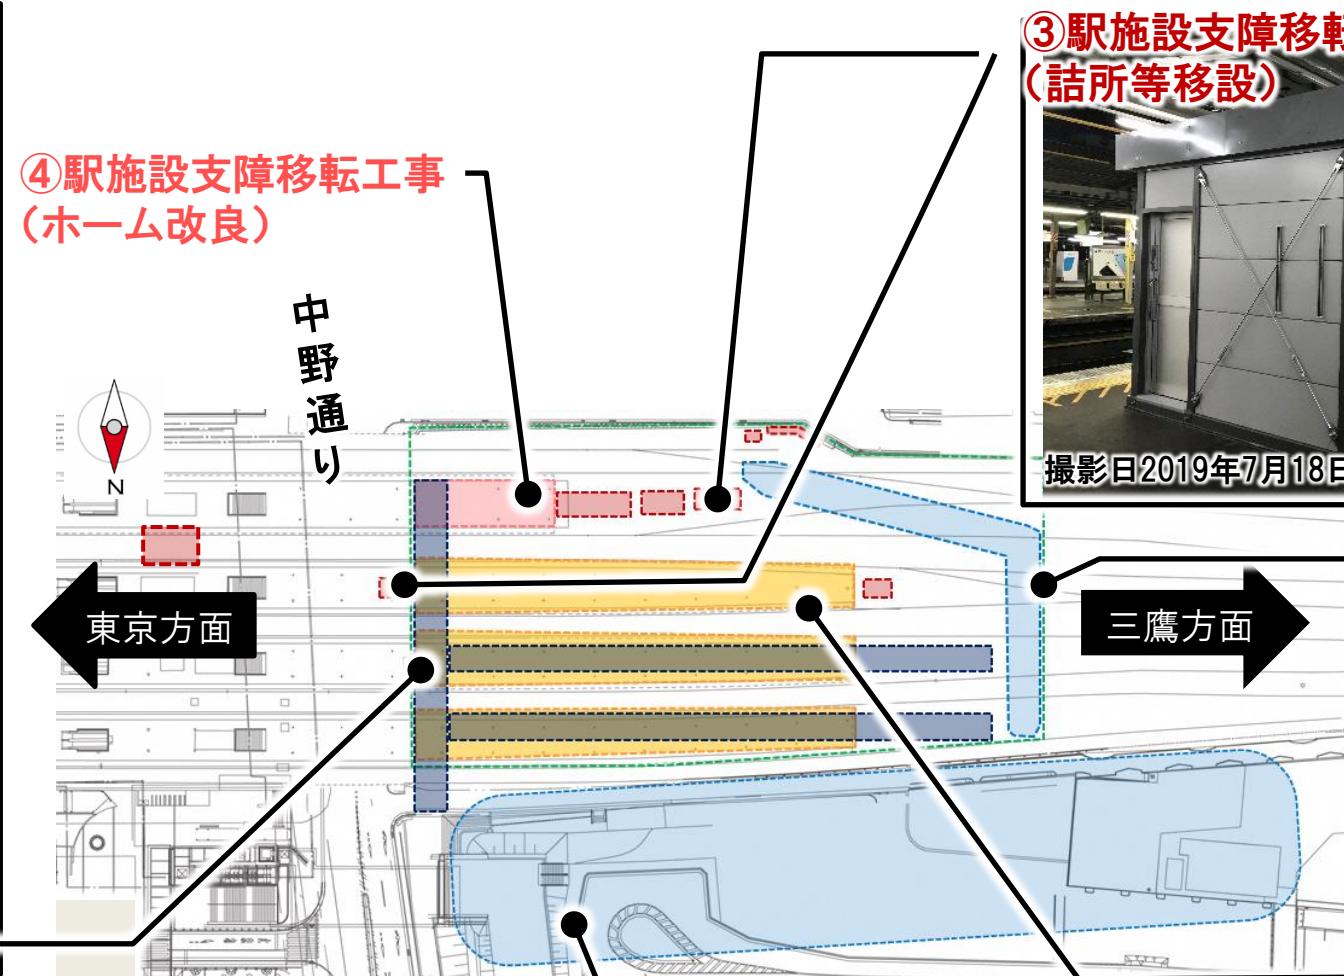


	2018年度				2019年度				2020年度			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
支障移転工事等												
			■									
					■ 工事用ヤード等整備工事							
					■ 杭施工準備等工事							
					■ ホーム改良工事							
					■ 詰所等移設工事							
					■ 上家改良工事							
					■ 電気設備支障移転工事							

① 現況通行可能動線

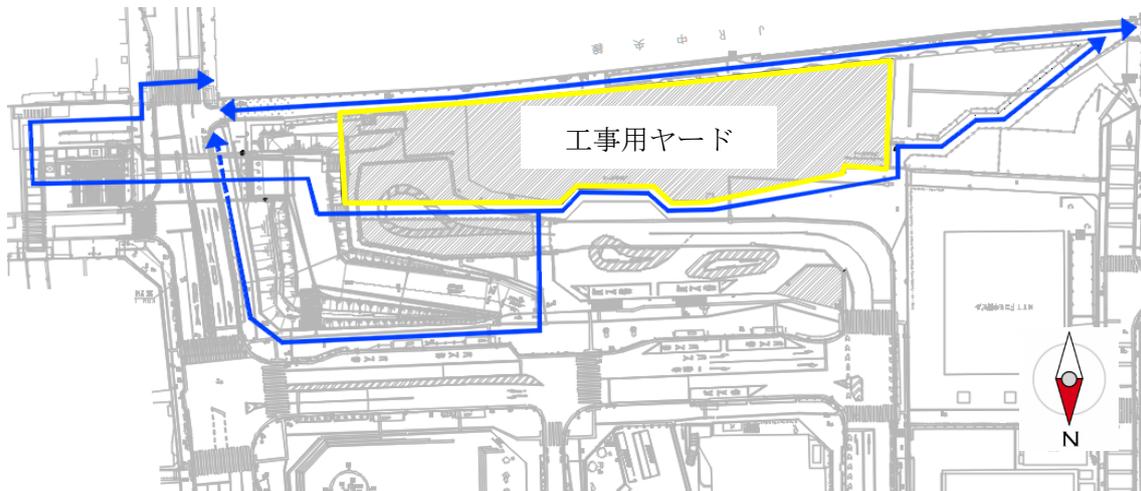

② 8月19日～9月30日

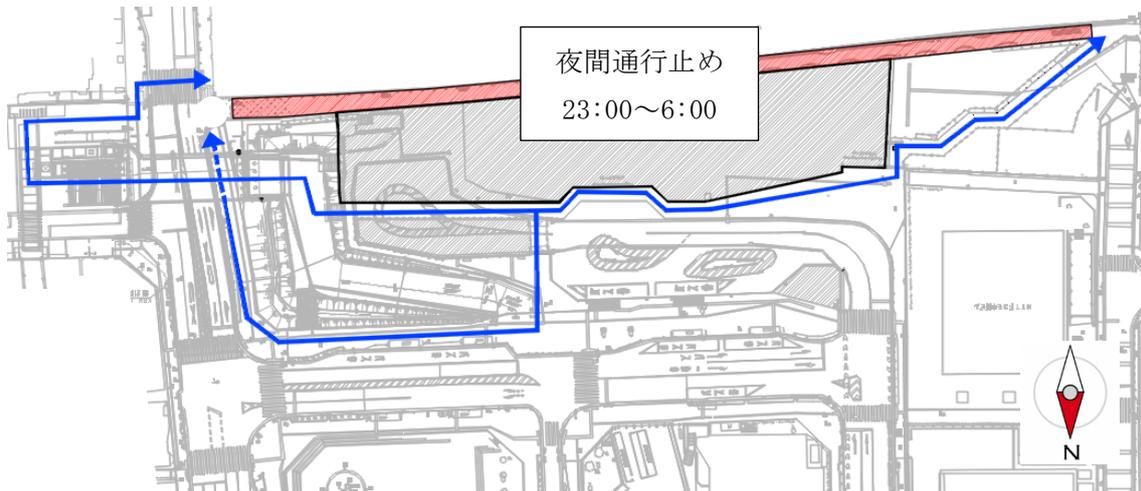

③ 10月1日以降

