

中野駅地区第2期整備先行工事について

中野駅地区第2期整備先行工事について、現在の工事の進捗状況と今後の工事内容について報告する。

1. 工事の進捗（別紙1）

① 施工中の工事

- ・ けやき通り自転車駐車場改修工事（工期：平成27年8月25日～10月26日）
- ・ 中野自転車保管場所改修工事（工期：平成27年8月25日～10月28日）

② 今後予定している工事（平成27年11月以降～年度末）

- ・ 北口中央自転車駐車場改修工事
- ・ 北口中央（建屋部分）、北口西自転車駐車場解体工事
- ・ けやき通り交差点化及び車両動線等整備工事

2. 今後の工事内容（別紙2）


- ① 北口中央自転車駐車場のラック設置等の改修工事を行い、改修完了後、北口中央自転車駐車場の建屋部分及び北口西自転車駐車場を撤去する。
- ② 北口暫定広場をバスロータリーとして整備するとともに、バス動線及び第2期整備の工事車両動線を整備する。また、けやき通りのカーブ部分をT字路交差点とし信号を設置するとともに、自転車走行空間の整備を行う。

3. 工事の進め方と自転車・歩行者の動線について（別紙3）

- ・ 工事期間中は工事作業箇所をバリケードで囲うとともに、けやき通りからの工事車両の出入口をNTTドコモビル側の1箇所とし、交通誘導員の配置により歩行者の安全を確保する。
- ・ 工事期間中における北口中央自転車駐車場の出入口は、区役所前横断歩道側の一か所に集約し、自転車動線は交通誘導員により区役所・中野サンプラザ間の道路に誘導する。
- ・ けやき通りのT字路交差点となる部分の工事は、バスの運行や歩行者の通行に配慮し、交通管理者と協議のうえ原則夜間工事で行う。



4. 今後の予定

平成27年10月23日（金）・24日（土）	中野駅北口における今後の工事の説明会
平成27年11月上旬	北口中央自転車駐車場改修工事、中野けやき通り交差点化及び車両動線等整備工事 工事着手
平成28年 1月末	北口中央自転車駐車場改修工事 工事完了
平成28年 2月上旬	北口中央（建屋部分）、北口西自転車駐車場解体工事 工事着手
平成28年 3月末	工事完了

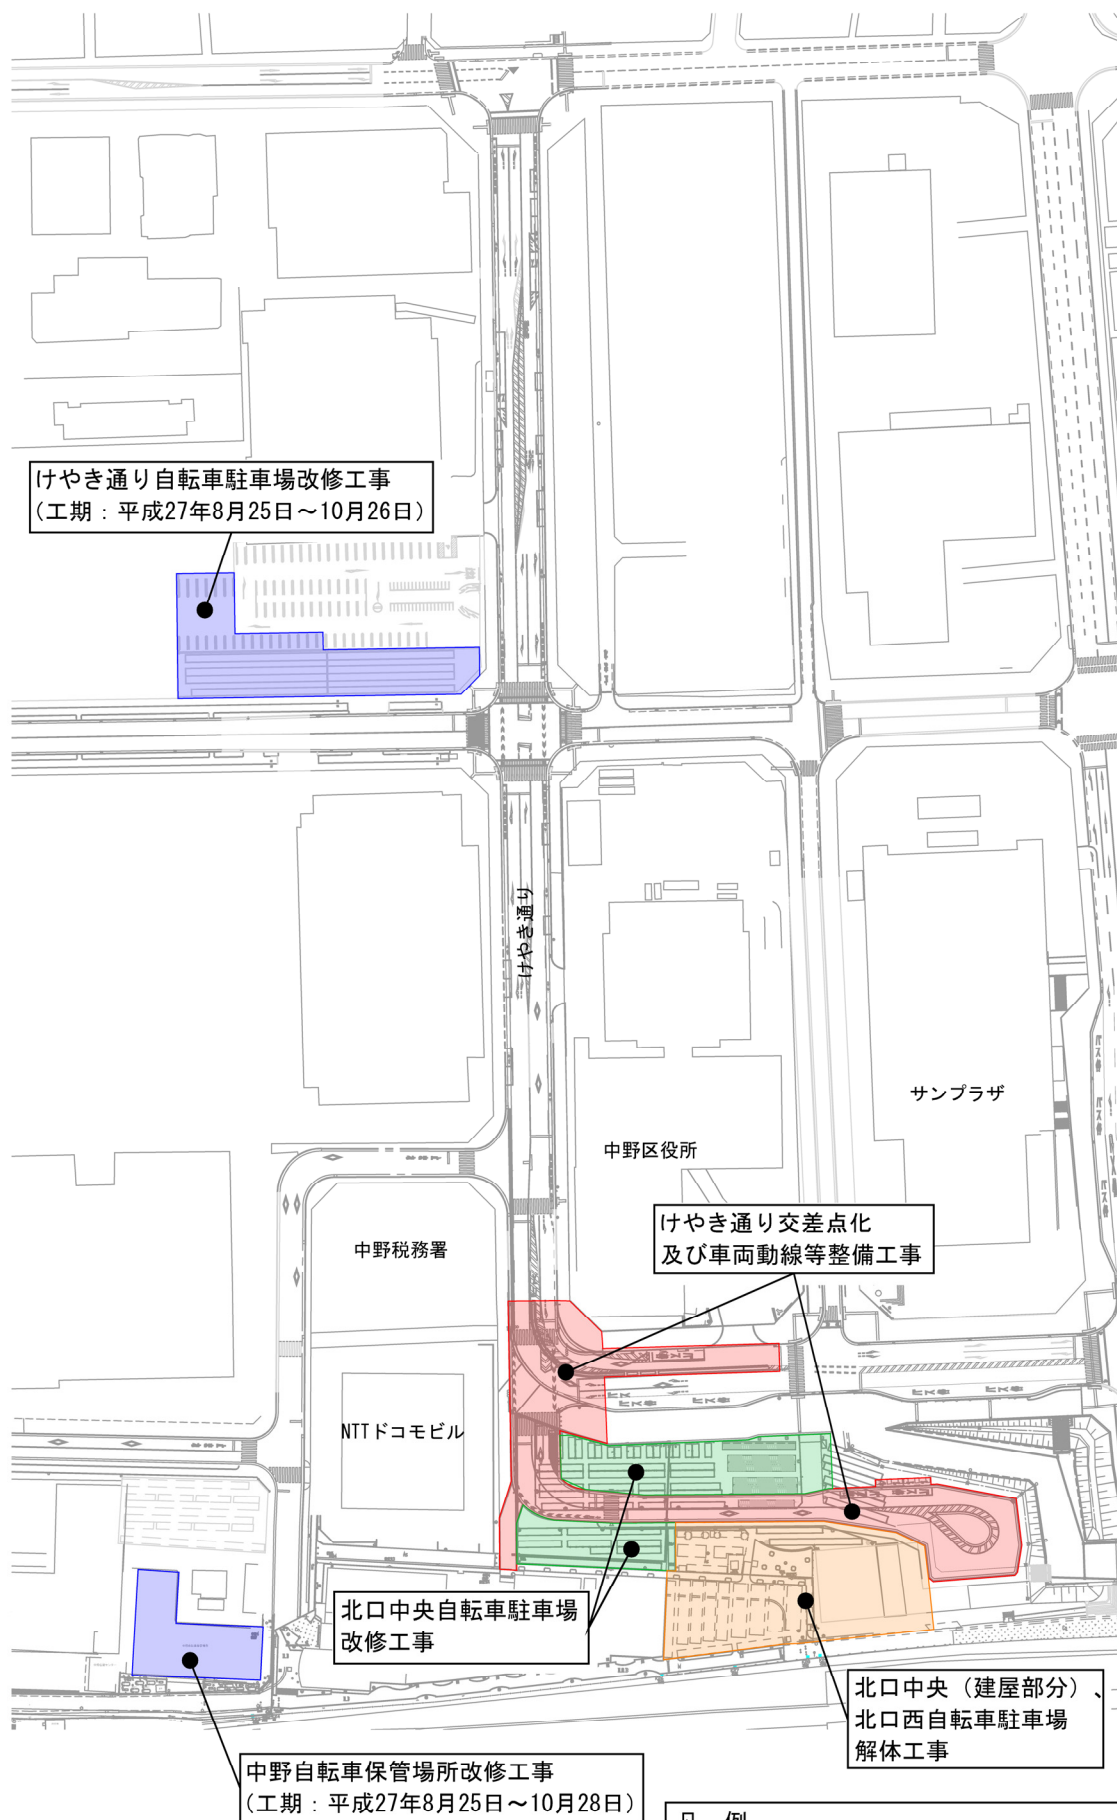


凡 例

- ：①施行中の工事
- ：②今後予定している工事

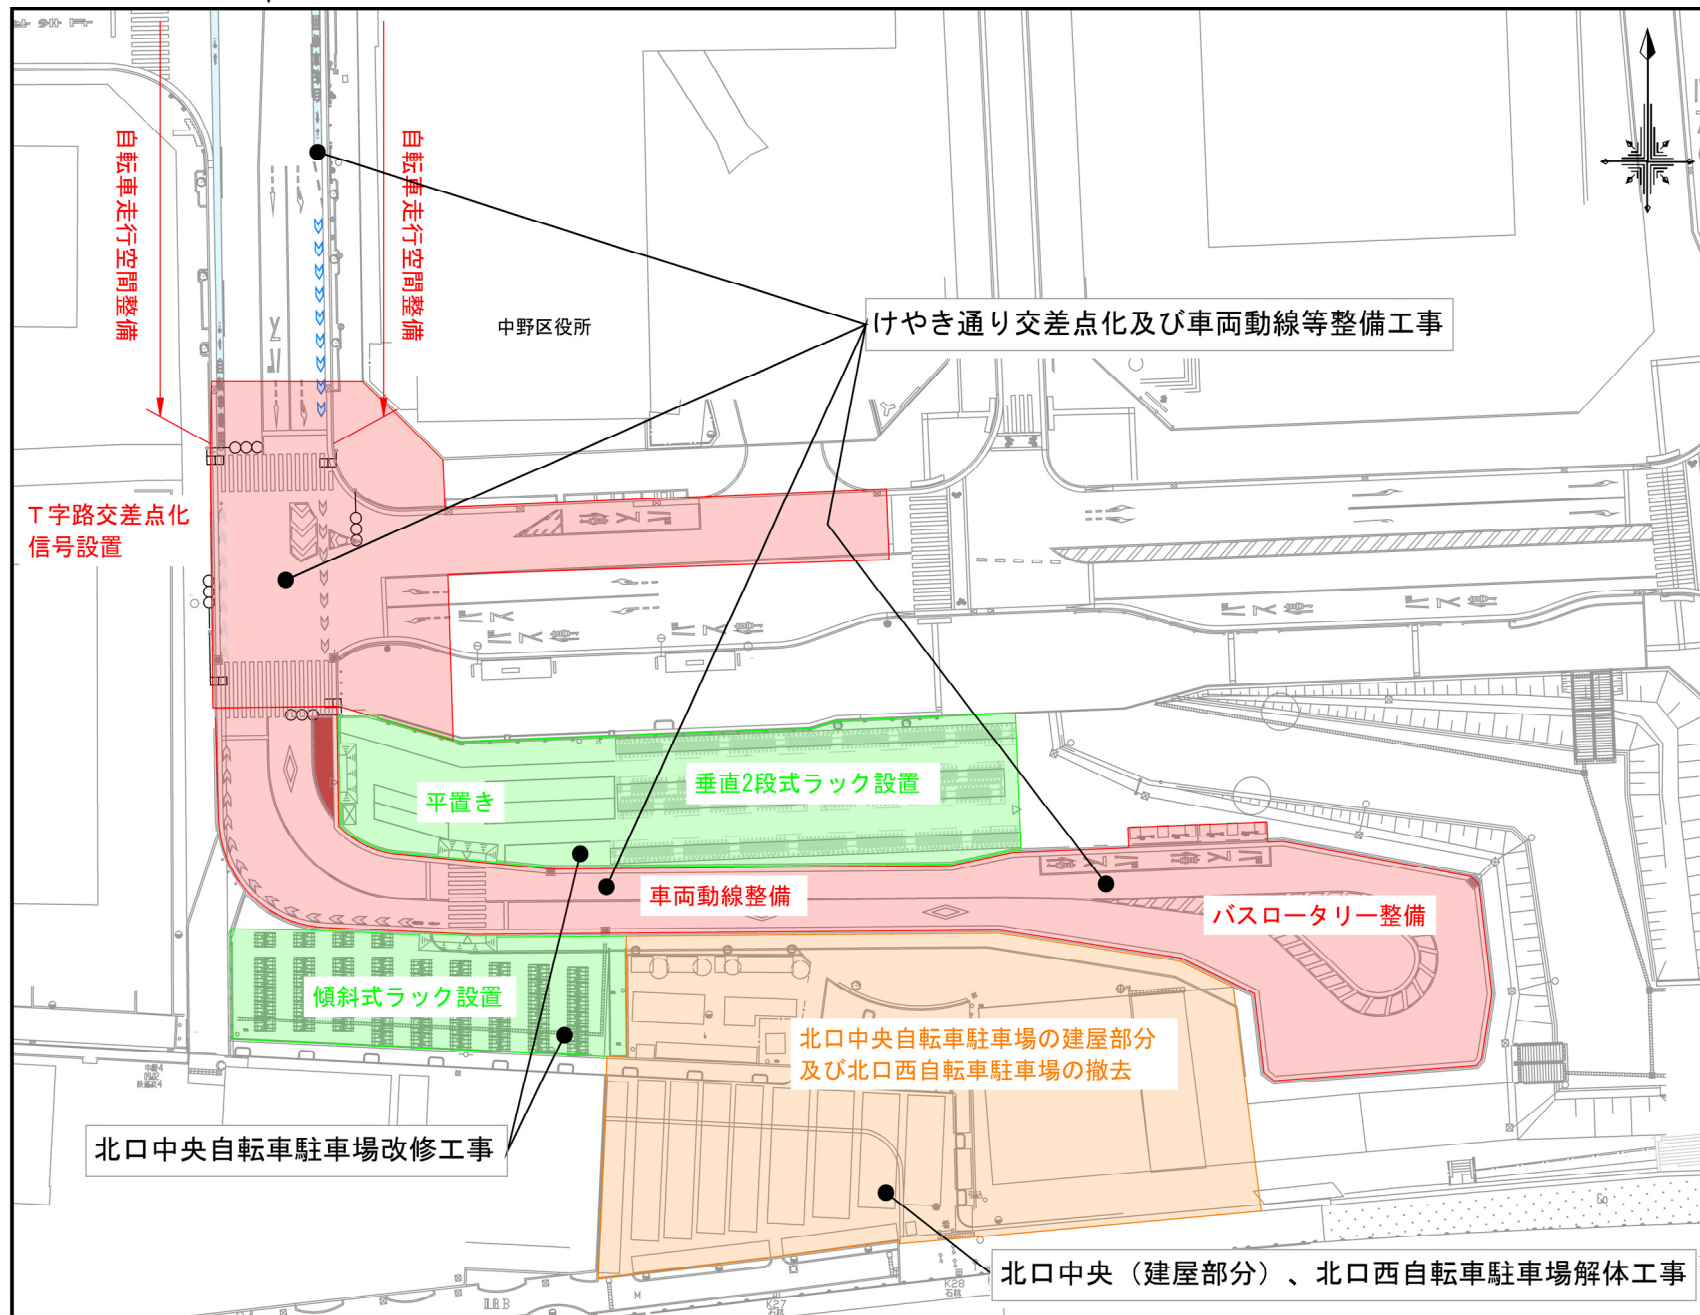


平成27年11月～

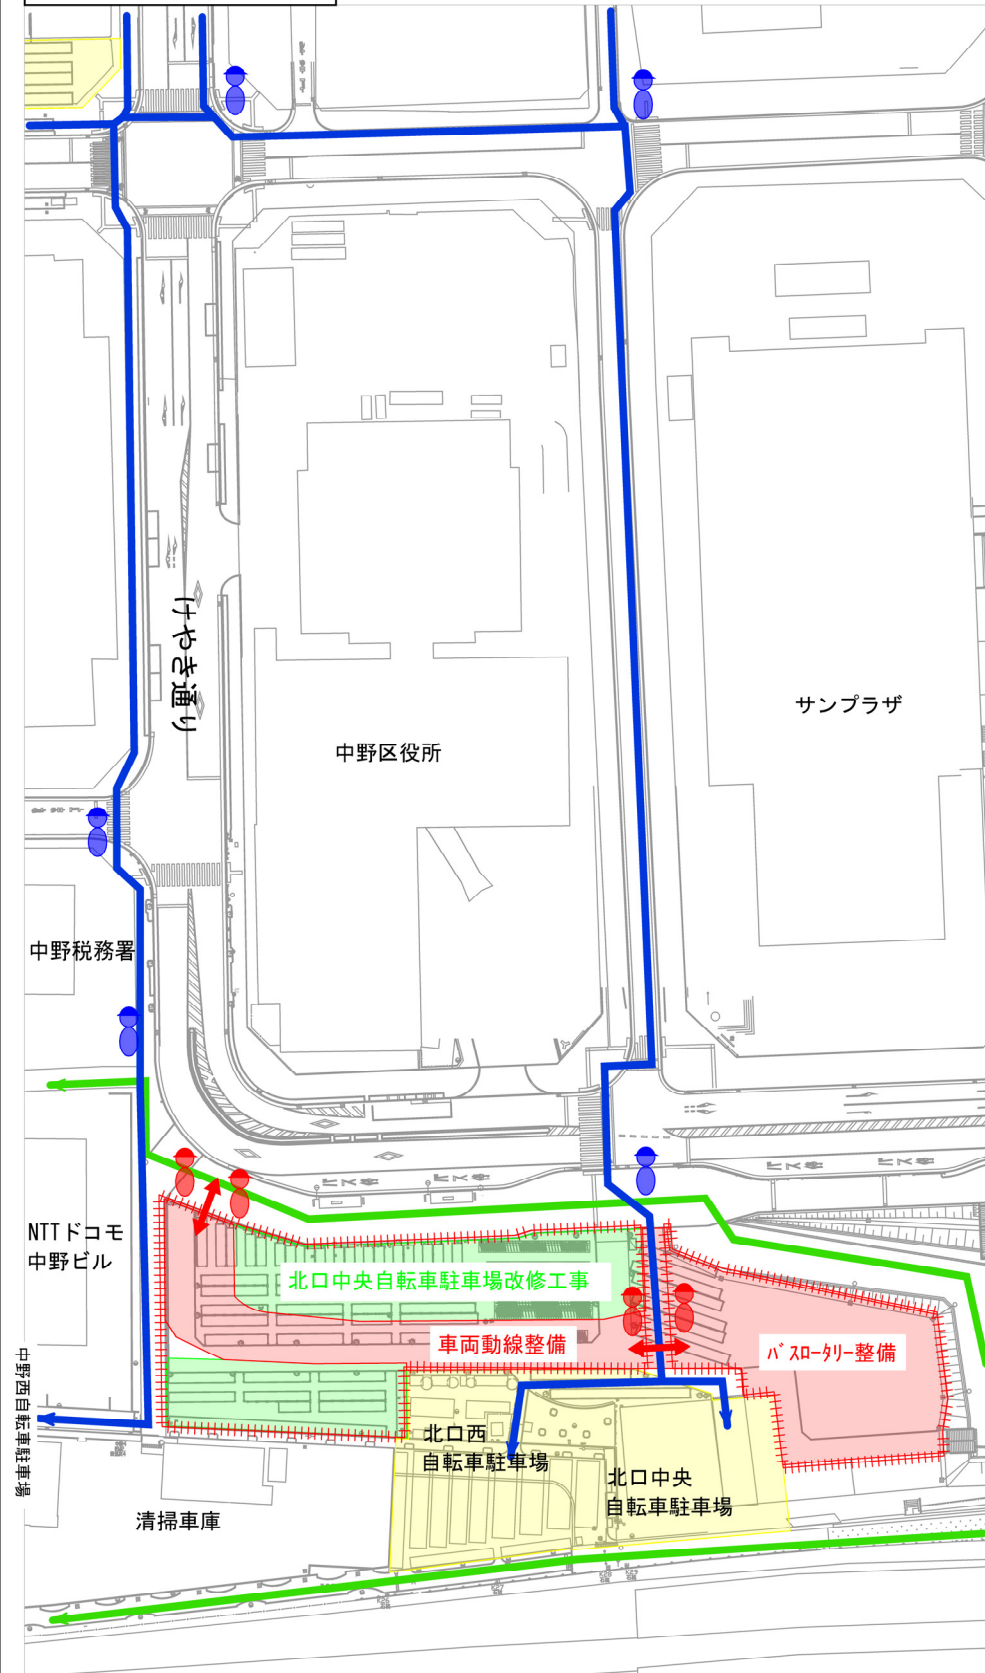

平成28年2月～



平成28年4月～（工事完了後）

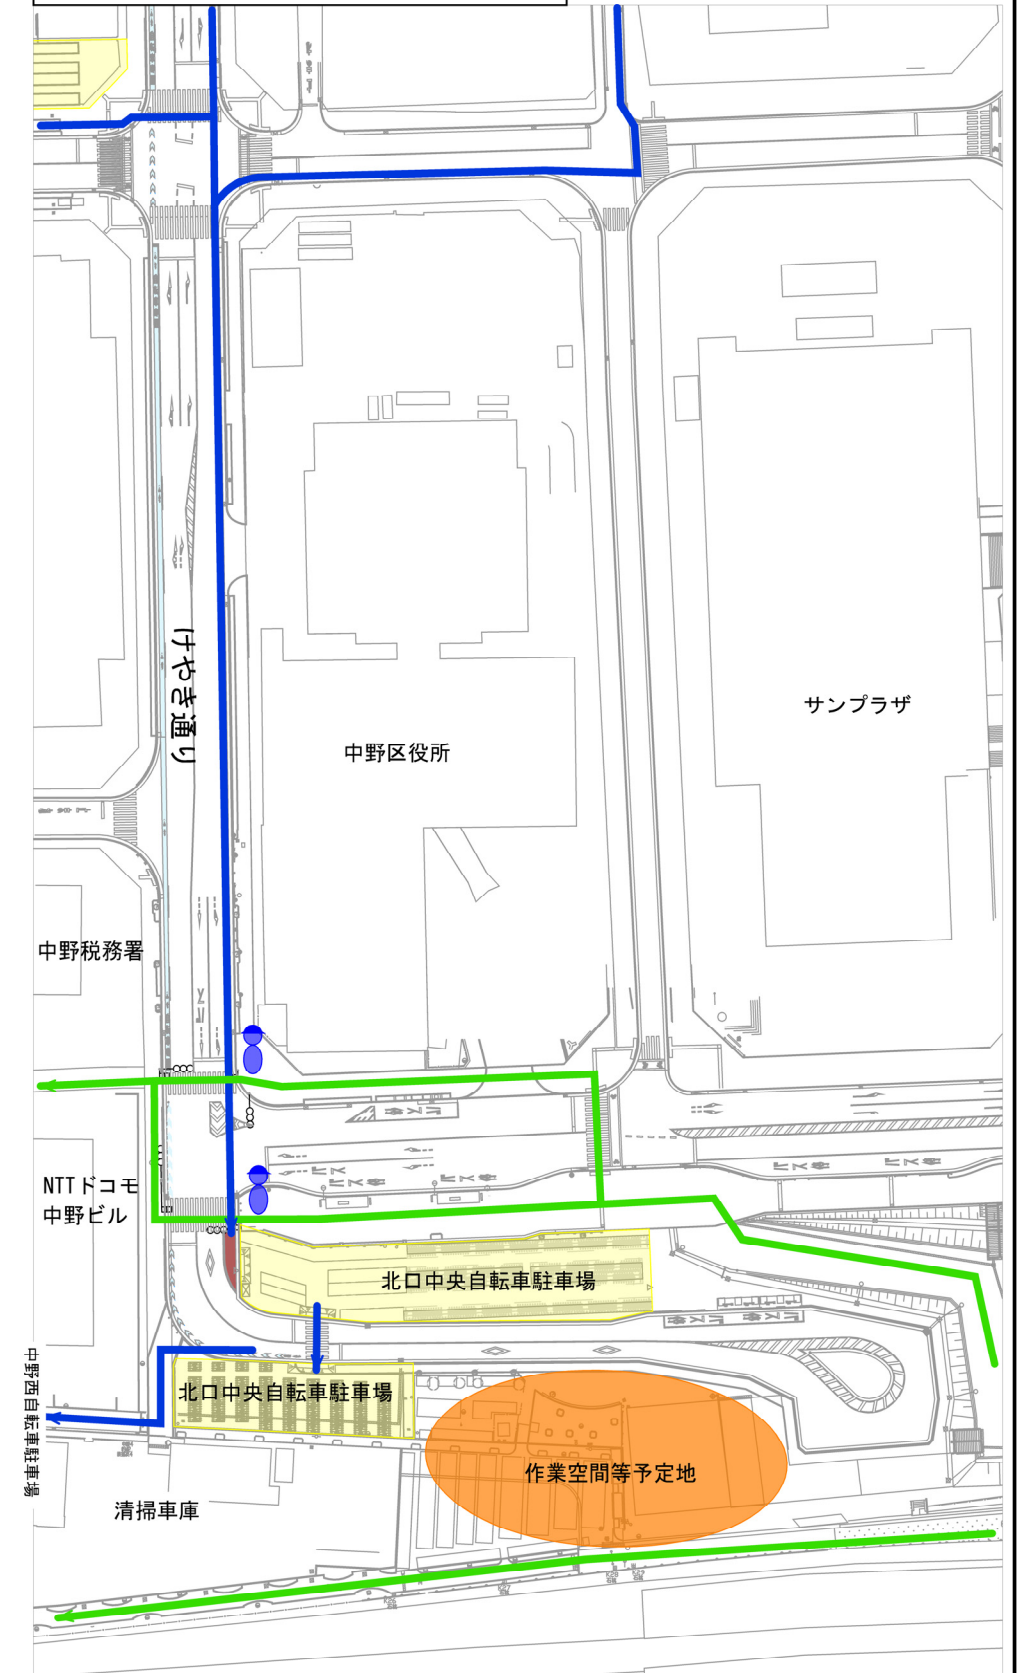

凡 例

- | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| — : 自転車動線 | ● : 交通誘導員 | ■ : 自転車駐車場改修工事 |
| — : 歩行者動線 | ● : 自転車誘導員
(現況、区役所前に配置している誘導員を含む) | ■ : 道路工事 |
| ↔ : 工事車両出入口 | ++++ : 工事用バリケード | ■ : 解体工事 |

※ 図中の誘導員は、配置の考え方を示したものであり、工事の各段階における歩行者・自転車の状況を踏まえ、場所、曜日、時間等、適切な配置を検討する。
