

中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について

中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について報告する。

1 南口駅前広場拡張工事の施工展開について

南口駅前広場拡張工事を令和6年6月から着手して進めている。
今般、バス利用者への動線変更が伴う工事に入ることから説明会を行う。
(別添資料参照)



中野二丁目地区 全体図

2 説明会について

日時 令和6年10月3日(木) 19時00分～
令和6年10月6日(日) 10時00分～
場所 産業振興センター
周知方法 区広報、区HP 等

3 今後の予定

令和6年度 駅前広場整備 工事着手
令和7年度 駅前広場整備 工事中
令和8年度 駅前広場整備 工事完了
令和9年度 土地区画整理事業完了


中野駅南口駅前広場 計画工程表

別添資料

項目	令和6年度												令和7年度												令和8年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
円形植栽帯、 防火水槽ほか撤去	STEP①																																			
地下埋設物設置 (雨水貯留槽・防火水槽)	STEP②																																			
駅前広場造成 (東側)	バス乗車場② 移設説明会 ★												STEP③																							
駅前広場造成 (東側・南側)	バス乗車場② 移設運用開始 ●												STEP④																							
駅前広場造成 (北側)													STEP⑤																							
南側交差点改良													STEP⑥																							
北側交差点閉鎖													STEP⑦																							
本設交番設置																									STEP⑧											
仮設交番撤去																																				

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。

整備前（令和6年4月時点）

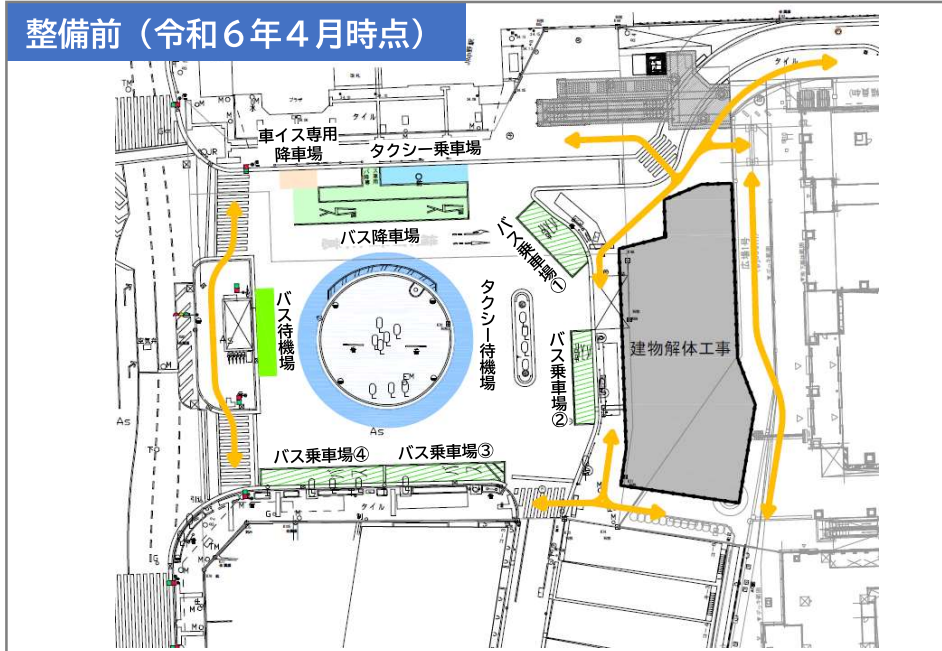

STEP①（令和6年8月時点）




STEP②（令和6年11月頃）



【凡例】

	バス乗車場
	バス降車場
	バス待機場
	タクシー乗車場
	タクシー待機場
	車イス専用降車場
	歩行者動線
	仮囲い


STEP③ (令和7年6月頃)

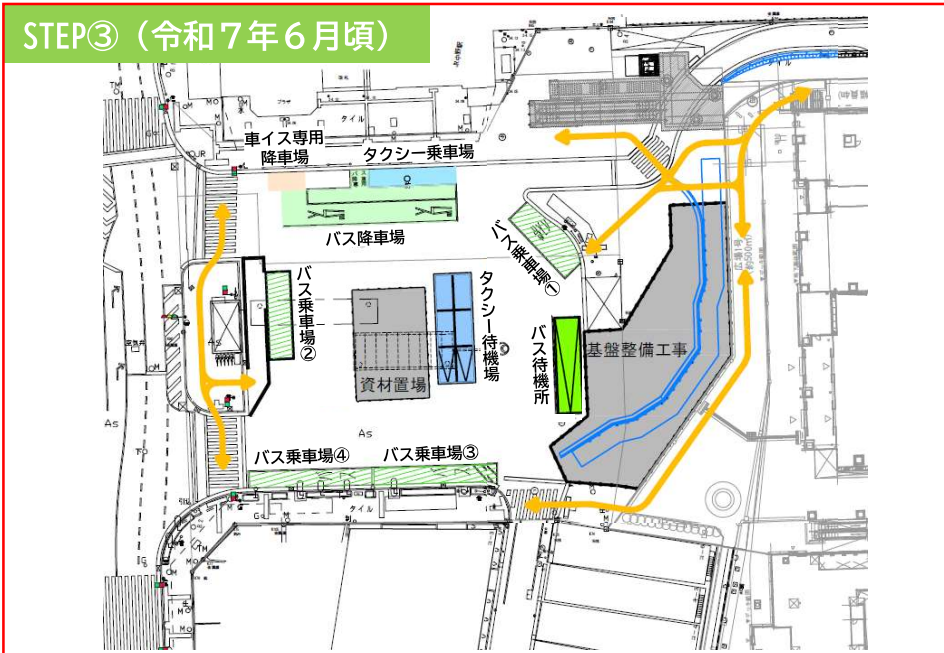


STEP④ (令和7年10月頃)



STEP⑤ (令和7年12月頃)

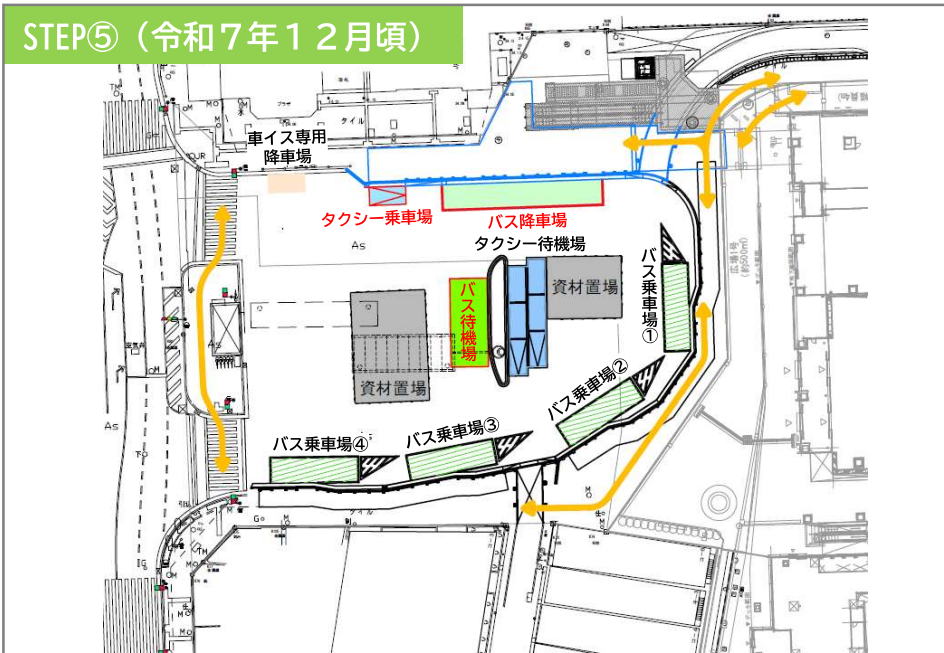


STEP⑥ (令和8年3月頃)

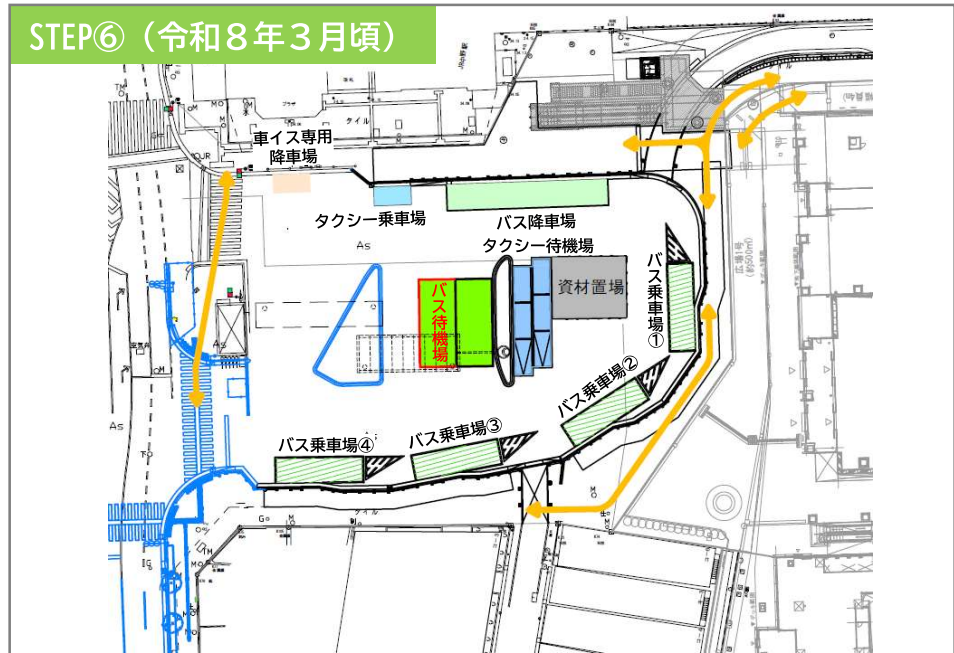

- 【凡例】
- バス乗車場
 - バス降車場
 - バス待機場
 - タクシー乗車場
 - タクシー待機場
 - 車イス専用降車場
 - 歩行者動線
 - 仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。


STEP⑦ (令和8年5月頃)

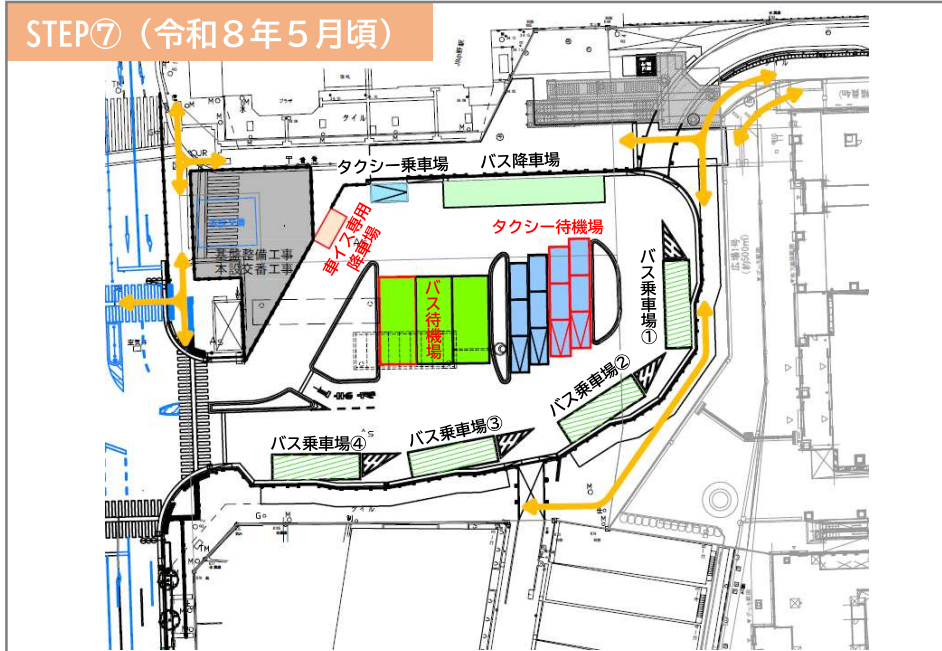

STEP⑧ (令和8年12月頃)



整備完了 (令和9年3月頃)

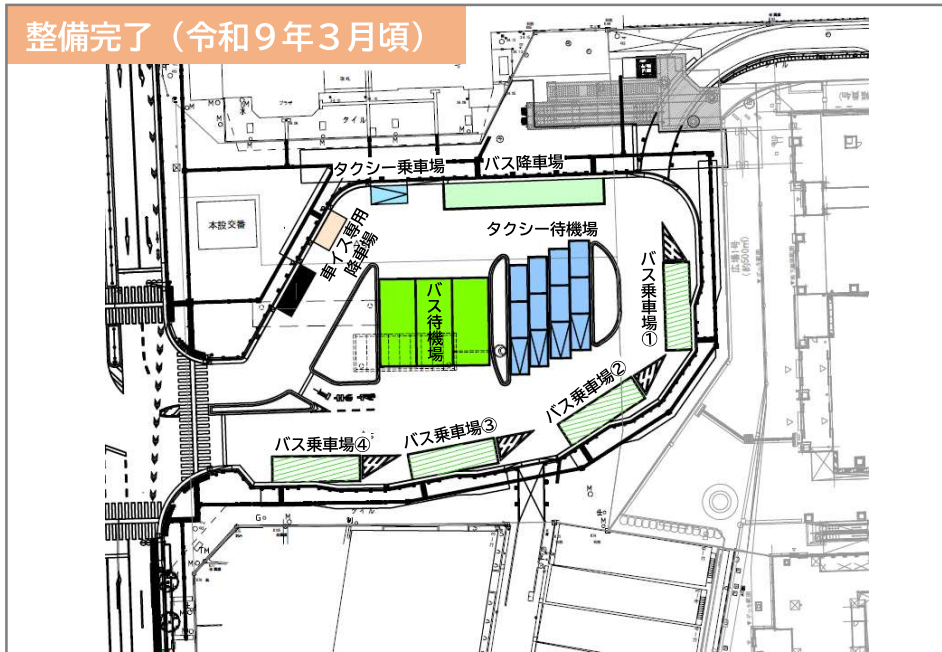

【凡例】

	バス乗車場
	バス降車場
	バス待機場
	タクシー乗車場
	タクシー待機場
	車イス専用降車場
	歩行者動線
	仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。
