

中野駅地区第 2 期整備先行工事について

1. 工事の目的

本工事は、駅北口西側における歩行者と自転車の交錯を防止し交通の円滑化を図り、中野駅周辺に暫定的に設けられているバス停を移設するとともに、今後、中野駅地区で予定している工事に必要な作業空間等を確保するために実施する。

2. 工事内容

（１）中野自転車保管場所・けやき通り自転車駐車場の改修（別紙 1－①）

中野自転車保管場所の自転車駐車場への改修及びけやき通り自転車駐車場の収容台数の増強を行い、収容台数が減となる北口中央自転車駐車場の代替施設とする。

（２）北口中央自転車駐車場の改修及び作業空間等確保（別紙 1－②、1－③）

保管場所・けやき通りの自転車駐車場改修後、北口中央自転車駐車場の改修工事を行う。改修完了後に、北口中央自転車駐車場の建屋部分及び北口西自転車駐車場を撤去し、作業空間等を確保する。

（３）バスロータリー・車両動線整備及びけやき通り T 字路交差点化（別紙 2）

暫定広場をバスロータリー化しバス停を移設するとともに、バスの安全な車両動線及び第 2 期整備の工事車両の作業空間等への動線を整備する。また、けやき通りにおける歩行者と自転車の安全性を高めるため、カーブ部分の T 字路交差点化（信号設置予定）及び自転車走行空間の整備を行う。


3. 今後の予定

- ・平成 27 年 7 月 24 日（金）・25 日（土） 先行工事についての全体説明会
- ・平成 27 年 8 月下旬 中野自転車保管場所・けやき通り自転車駐車場の改修工事
個別説明・工事着手
- ・平成 27 年 10 月 北口中央自転車駐車場の改修及び作業空間等確保、バスロータリー・車両動線整備及びけやき通り T 字路交差点化の
工事説明会
- ・平成 27 年 11 月上旬 同 工事着手
- ・平成 28 年 3 月末 工事完了（仮設バス停の供用開始）

中野駅地区第 2 期整備先行工事の内容及び交通動線の考え方

- ① 中野自転車保管場所・中野けやき通り自転車駐車場の改修（8 月～10 月まで）
- ・中野自転車保管場所の改修

・中野けやき通り自転車駐車場の改修

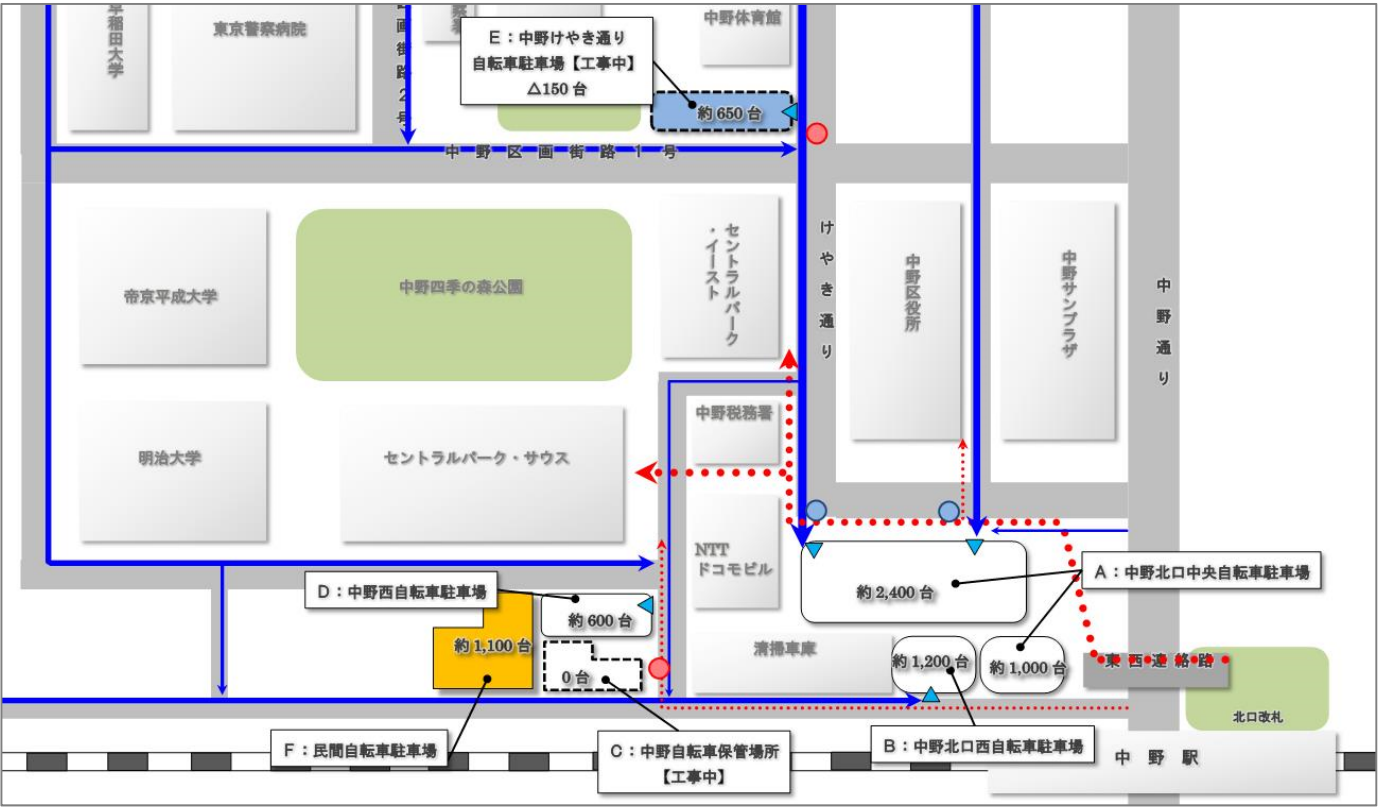


- ② 北口中央自転車駐車場の改修及び作業空間等確保（11 月～1 月まで）
- ・中野駅北口中央自転車駐車場の改修



- ③ 北口中央自転車駐車場の改修及び作業空間等確保（2 月～3 月まで）
- ・中野駅北口中央自転車駐車場の建屋部分の撤去

・中野駅北口西自転車駐車場の撤去



【参考】平成 27 年度の中野駅北側自転車駐車場の収容台数推移

	単位：台					【従前検討の整備台数】
	4月	5月～7月	8月～10月	11月～1月	2月～3月	平成27年1月 議会報告時
A:中野駅北口中央 自転車駐車場	3,400	3,400	3,400	工事着工 一部休止 1,000	利用開始 1,800	2,200
B:中野駅北口西 自転車駐車場	1,200	1,200	1,200	工事着工 一部休止 1,000	廃止 0	0
C:中野自転車 保管場所	0	0	工事着工 0	中野西自転車駐車場として 利用開始 700	700	1,600
D:中野西 自転車駐車場	600	600	600	600	600	600
E:中野けやき通り 自転車駐車場	800	800	工事着工 一部休止 650	利用開始 1,800	1,800	1,600
F:民間 自転車駐車場	0	利用開始 1,100	1,100	1,100	1,100	0
収容台数合計	6,000	7,100	6,950	6,200	6,000	6,000

＊上記のうち、網掛け部は仮整備箇所を示す。

