

旧区役所低層棟の解体工事および仮設バス停整備の進捗状況について

中野駅新北口駅前広場及びペDESTリアンデッキ等の基盤施設については、独立行政法人都市再生機構、東日本旅客鉄道株式会社及び囲町東地区市街地再開発組合への委託により、随時、工事に着手している。

今回、これらの基盤施設の整備状況について、以下のとおり報告する。

1. 旧区役所低層棟の解体工事および仮設バス停整備について

旧区役所低層棟の解体工事のうち、地上部については概ね除却が完了している。地下部の埋め戻しについては、流動化処理土がプラントから円滑に供給されなかったこと等から、解体工事工程に約2ヵ月の遅延が生じている。


そのため、旧区役所低層棟の解体工事の完了時期は、令和7年5月頃から同年7月頃に変更となる。その後、仮設バス停の整備工事に着手し、秋頃からの運用開始を予定している。

2. 中野駅新北口駅前広場のペDESTリアンデッキ整備について

中野駅新北口駅前広場のペDESTリアンデッキについては、令和8年末頃の中野駅西口改札開業に向けて工事を進めている。現在は、下部工の基礎工事を進めている。


また、中野駅西側南北通路・ペDESTリアンデッキレベルと新北口交通広場・東西連絡路レベルを繋ぐ仮設階段と新北口歩行者広場部分の整備は、駅ビルの荷捌き駐車場の上であることから東日本旅客鉄道株式会社へ委託する予定である。

令和8年度

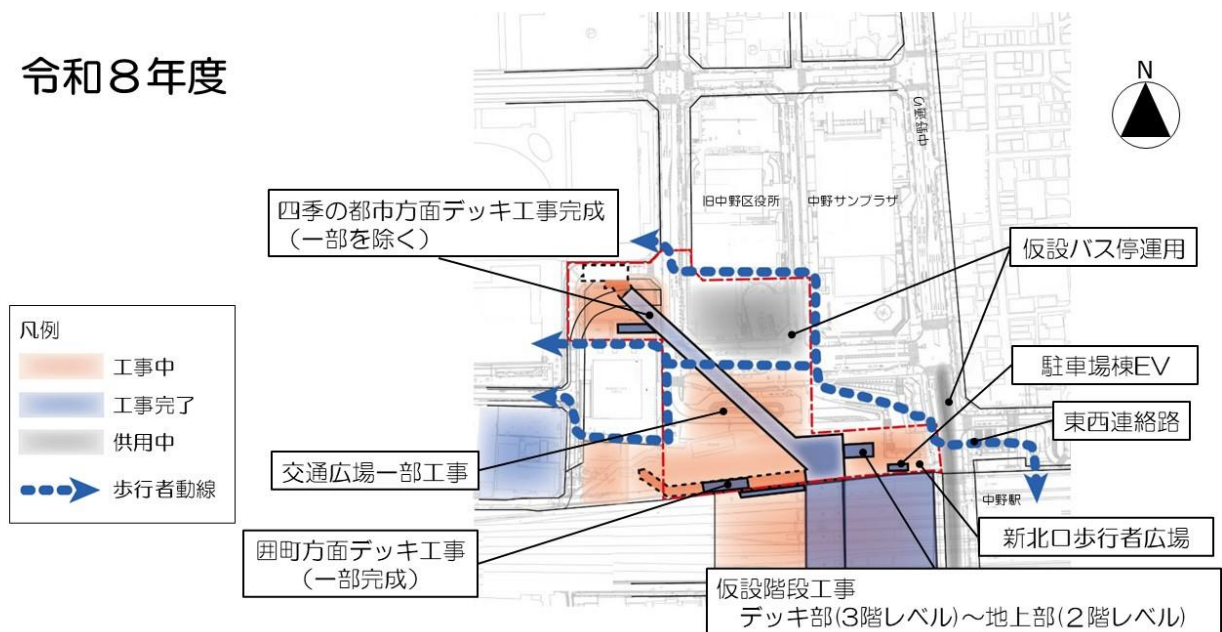



旧区役所低層棟の解体状況

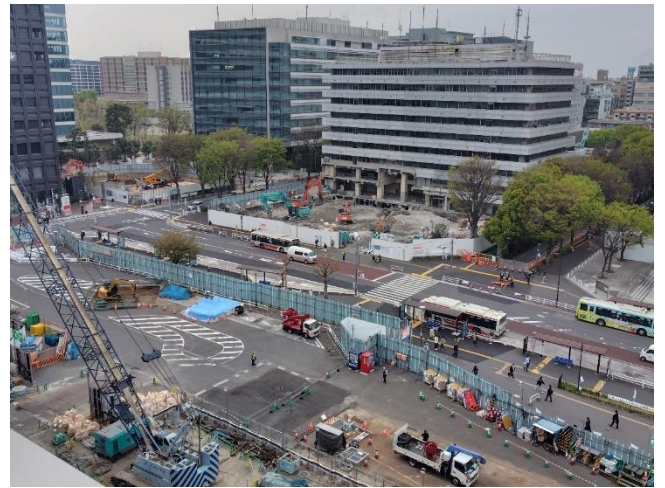

ペデストリアンデッキ下部工の基礎工事の状況

3. 中野駅西側南北通路の桃園広場側降し口の整備について

中野駅西側南北通路の桃園広場側降し口については、中野駅西口改札開業に向けて工事を進めている。現在は、デッキ上部工等の工事を進めている。



桃園広場側の工事状況

4. 今後の予定

令和7年度	旧区役所低層棟・旧中野税務署解体完了 仮設バス停整備工事着手・運用開始 旧中野税務署跡地インフラ移設工事着手
令和8年度	中野駅西口改札開業 ペデストリアンデッキ工事完了（一部を除く）・供用開始
令和11年度	中野駅新北口交通広場供用開始
