

無電柱化事業の進捗状況について

1 主な路線の進捗状況

弥生町三丁目周辺地区避難道路2号（以下「弥生2号」という。）及び避難道路7号（以下「弥生7号」という。）、大和町地区避難道路5号（以下「大和5号」という。）について、東京都の無電柱化チャレンジ支援事業を活用し、調査、設計を進め占用事業者との調整を図っている。

また、区と東京電力パワーグリッド株式会社及び東電タウンプランニング株式会社の三者で協定を締結し、電線管理者施行による協定事業として推進している。

電線共同溝は電線類を収容する管路や分岐、管理に必要となる特殊な柵等、多くの構造物を道路下に埋設する必要があるものの、区道は道路幅員が限られる上、住宅が密集するため、ライフライン埋設物が輻輳しており、各占用事業者との調整や施工方法等も広幅員の都道等と比較して難易度が高くなっている。加えて変圧器等の地上機器の設置場所が限られており、構造物や設備の工夫、沿道の公園、事業残地の活用等にも取り組んでいる。

今年度は、弥生2号においては、年度内の電線共同溝本体工事の着工に向け準備を進めている。また、弥生7号は、詳細設計と試掘調査を、大和5号では、年度内試掘調査の実施に向け準備を進めている。さらに、主幹1号（新橋柳通り）では、バリアフリー化と併せた電線共同溝整備について基礎調査を進めている。（裏面「位置図」参照）

2 弥生こぶし公園の一時閉鎖について


弥生2号沿道の弥生こぶし公園については、園内への地上機器及び関連施設の設置工事を行うため、令和3年1月上旬から令和4年にかけて一時閉鎖を予定している。同公園は工事完了後、施設の復旧を行い、令和4年末の再開を予定している。

3 今後の予定

令和2年度	弥生2号本体工事着工、弥生こぶし公園閉鎖 弥生7号詳細設計・試掘調査、大和5号試掘調査
令和3年度	弥生2号本体工事 弥生7号支障移設工事、大和5号詳細設計
令和4年度以降	弥生2号引込管・連系管工事、弥生こぶし公園再開 弥生7号本体工事着工、大和5号支障移設工事

位置図

中野区全体図

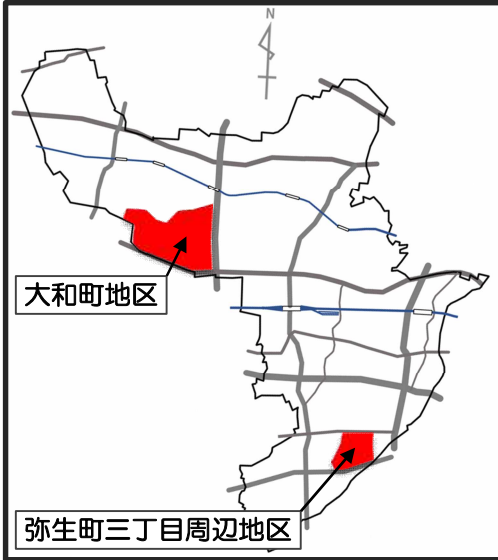

大和町地区



弥生町三丁目周辺地区

